



GF Øresund Information om projektets forløb

8. marts 2017, Mikas Schmidt Christiansen

Tidsplan 2017

14. marts
Opstartsmøde

3. april
Opstart
anlægsarbejder

10. juli
Aflevering af nye veje
Gennemgang af udført
projekt med bestyrelsen



1. Før opstart; vejene som de ser ud i dag



1. Træer der er røde fjernes som det første fra 3. april 2017



2. Sektioner, der arbejdes efter denne opdeling. Cirka 10-17 dage i hver sektion

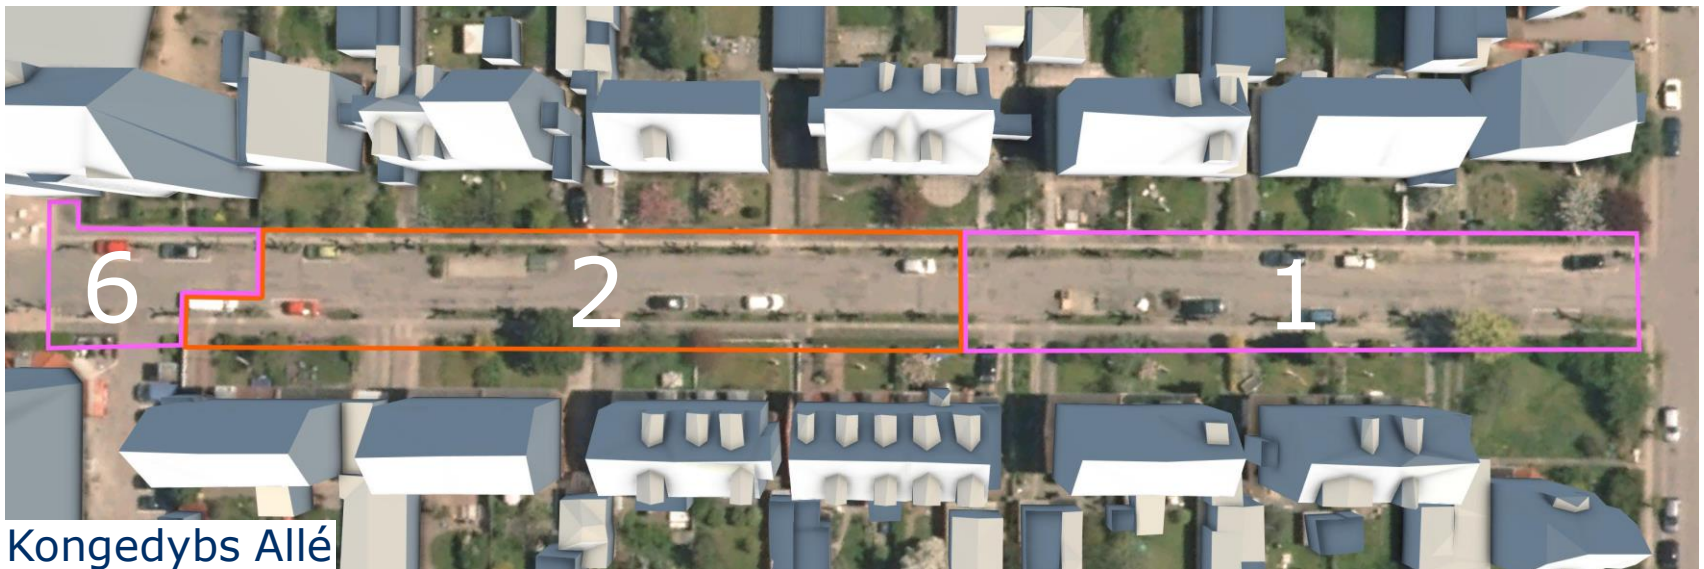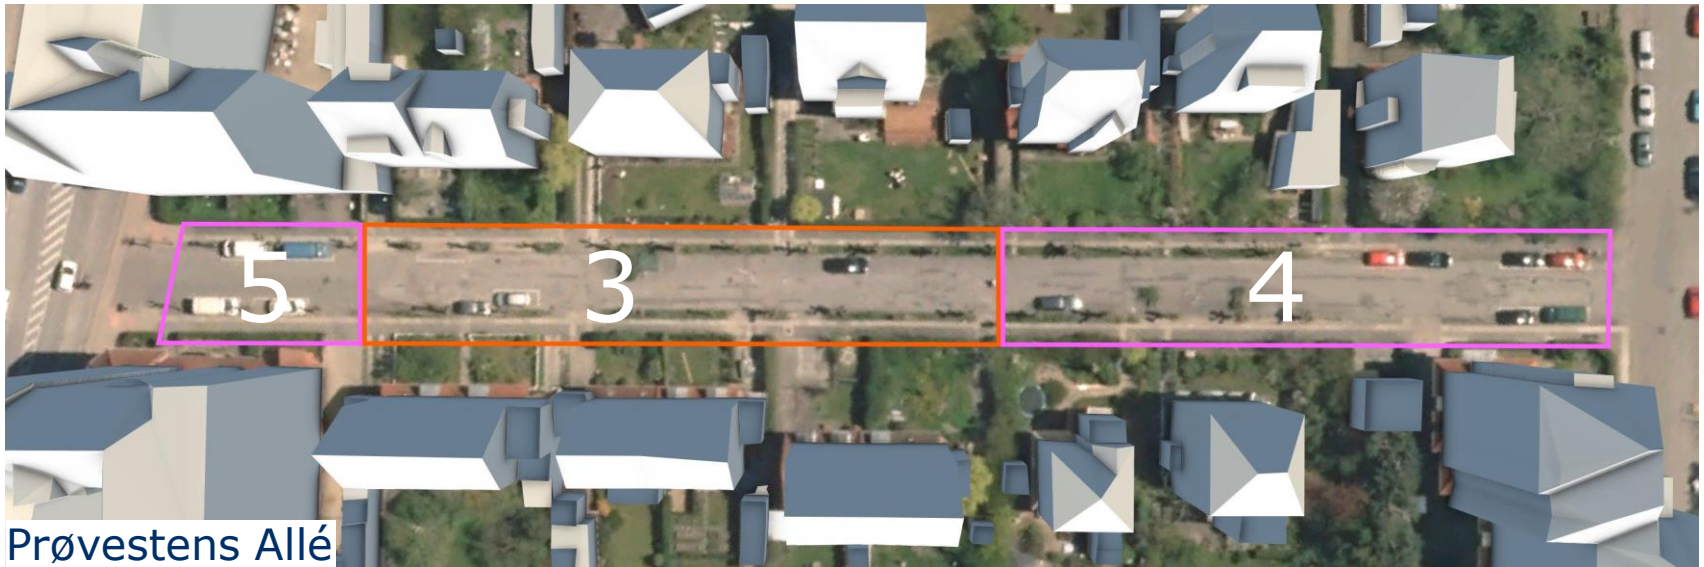

2.1 Fortov og grus ved fortove (sektion 4)

I den sektion hvor vi arbejder vil være nedsat fremkommelighed.

Første tiltag i hvert område er fortove der hvor der ikke er indkørsler og parkering

-  Mandskabsvogn (står i hele byggeperioden)
-  Container med materialer (lukket)
-  P-plads til maskine
-  Plads til oplag af materiale

Containere med byggeaffald, container med materiale og plads til oplag af materiale flytter med rundt i aktuel sektion, hvor der arbejdes



2.2 Indkørsler, fortove, græsarm.(sektion 4)

Andet tiltag i hvert område er fortove og græsarmering der hvor der er indkørsler. Den enkelte ejendom får et infoskriv dagen før arbejdet går i gang på deres indkørsel

-  Mandskabsvogn (står i hele byggeperioden)
-  Container med materialer (lukket)
-  P-plads til maskine
-  Plads til oplag af materiale

Containere med byggeaffald, container med materiale og plads til oplag af materiale flytter med rundt i aktuell sektion, hvor der arbejdes



2.3 Regnbede, (sektion 4)

3. tiltag i hvert område er regnbede (og petanque i sektion 2)

-  Mandskabsvogn (står i hele byggeperioden)
 -  Container med materialer (lukket)
 -  P-plads til maskine
 -  Plads til oplag af materiale
- Containere med byggeaffald, container med materiale og plads til oplag af materiale flytter med rundt i aktuel sektion, hvor der arbejdes



2.4 Udlægger muld og sår græs (sektion 4)


4. tiltag i hvert område er finish på overflader

-  Mandskabsvogn (står i hele byggeperioden)
-  Container med materialer (lukket)
-  P-plads til maskine
-  Plads til oplag af materiale

Containere med byggeaffald, container med materiale og plads til oplag af materiale flytter med rundt i aktuell sektion, hvor der arbejdes




3. Asfalt, det vil ikke være muligt at køre på vejene de 2 dage der udlægges ny asfalt (slidlag) – Der informeres i god tid før opstart

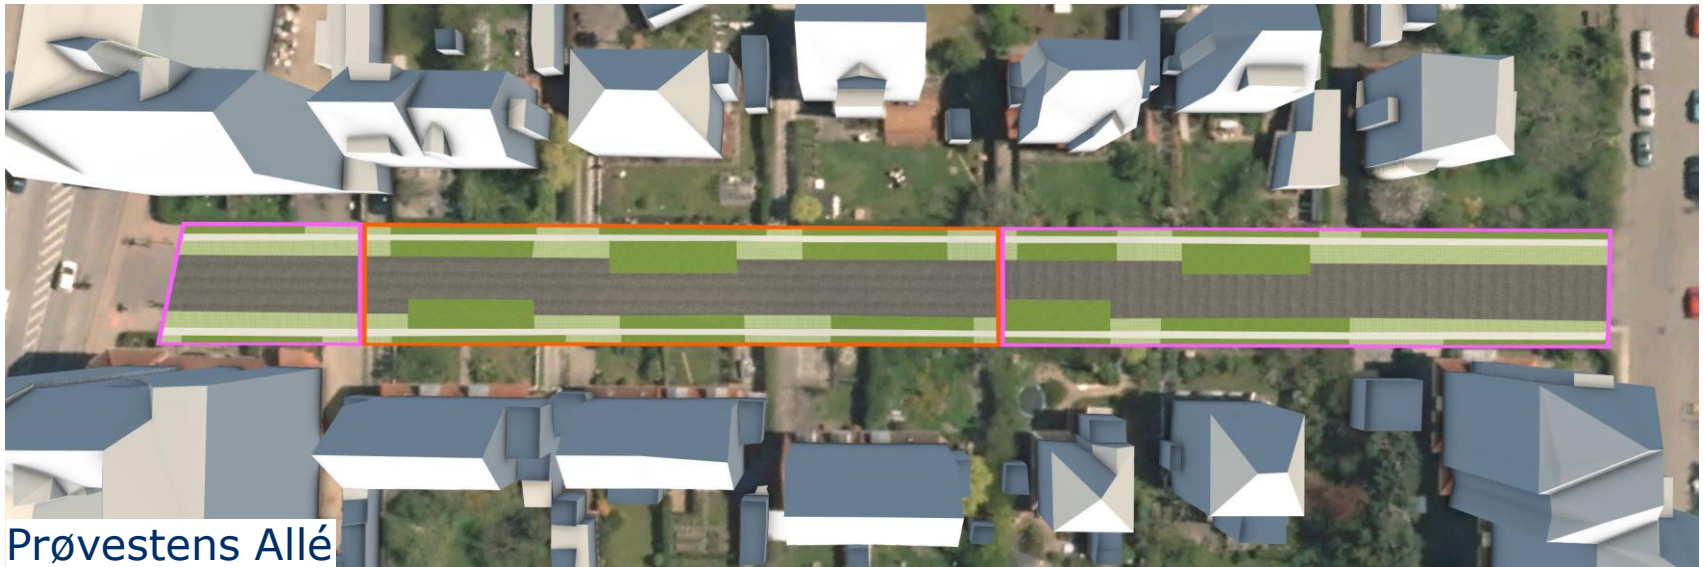


4. Parkering og grønne felter i asfalt – afsluttet inden 10. juli 2017

Striber til parkering grønne felter vil også medføre 2 døgn uden kørsel

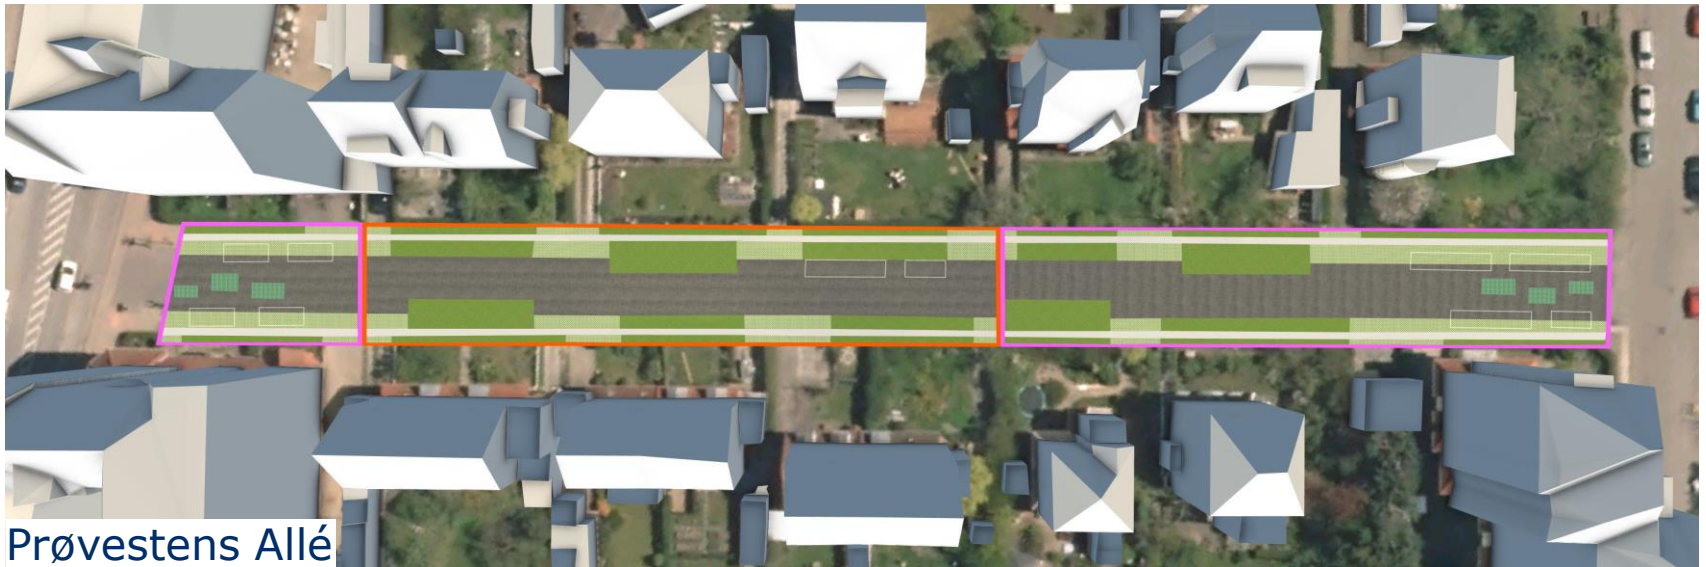

5. Træer plantes, vil først ske i efteråret 2017 efter nærmere aftale med København Kommune

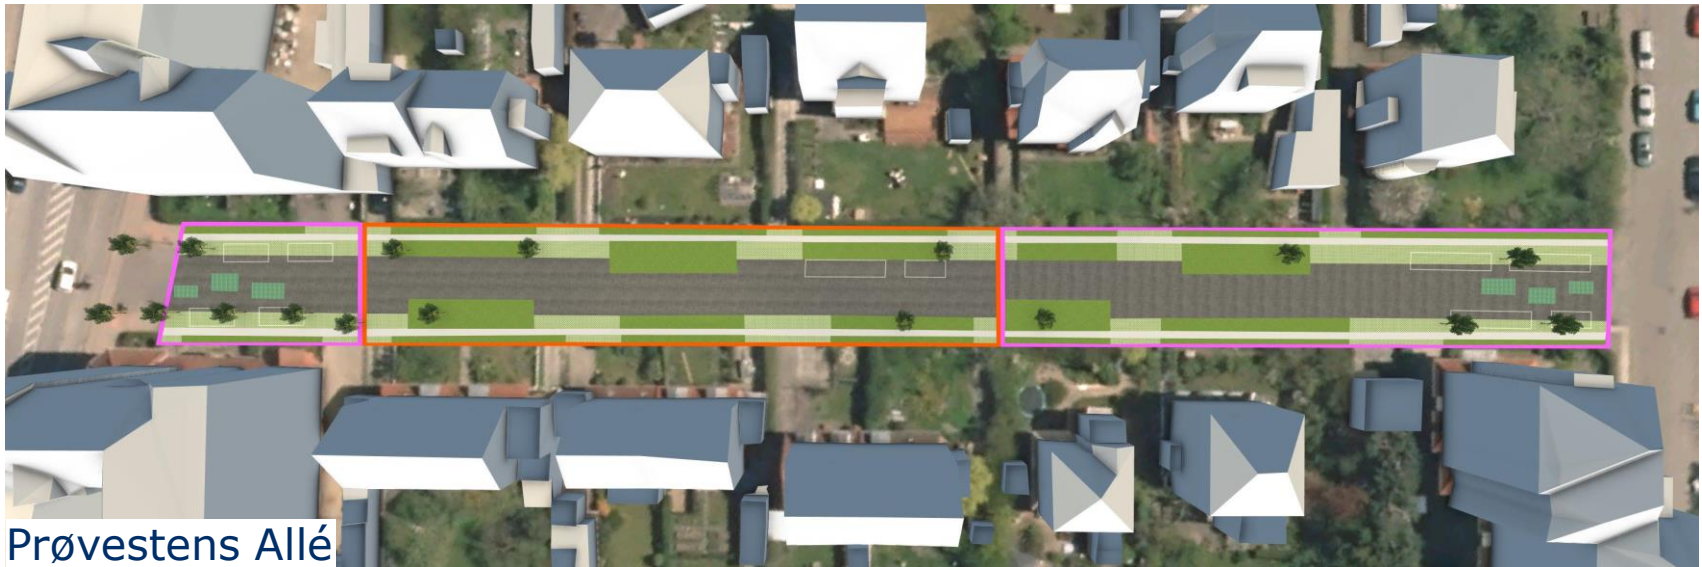

Noget af det sidste der fjernes er containere til materialer



Illustration af det færdige resultat set fra oven

